みよし市橋梁長寿命化修繕計画



井守橋

令和８年９月　改定

みよし市　都市建設部　道路河川課

目　次

１ 長寿命化修繕計画の目的 3
(1) 背景 3
(2) 目的 3
(3) 方針 3
(4) 計画期間 3

２ 長寿命化修繕計画の対象橋梁（対象橋梁の概況） 4
(1) 計画対象の橋梁数 4
(2) 橋梁の構成 4
(3) 橋梁の年齢 5

３ 健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 6
(1) 健全度の把握に関する基本的方針 6
(2) 日常的な維持管理に関する基本的方針 7

４ 対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 9
(1) 基本的な方針 9
(2) 優先順位の設定 10
(3) 新技術等の活用に関する具体的な方針 11
(4) 橋梁の集約化・撤去について 11

５ 対象橋梁ごとの点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 12
(1) 定期点検結果の整理 12
(2) 修繕内容・時期又は架替え時期の設定 14
(3) 修繕措置の着手状況 14

６ 長寿命化修繕計画による効果 14
(1) 維持管理方針別のライフサイクルコスト 15
(2) 維持管理方針の転換によるコスト縮減効果 16

７ 計画策定担当部署 16

８ 対象橋梁一覧（年次計画） 17

1　長寿命化修繕計画の目的

(1)　背景

全国の自治体においては、高度経済成長期以降に大量に整備された社会資本の老朽化が進行しており、安全性の低下と点検・修繕等に伴う費用の一定年度への集中や増加が懸念されている。

みよし市においても例外ではなく、管理橋梁 92 橋のうち、架設後 50 年以上を経過した橋梁の割合は、30 年後には現在の約 6.5%から約 87%と急激に増加する見込みとなっている。このような状況においてみよし市では、平成 26 年度の道路法省令の改正以降、全ての橋梁で定期点検を完了したところであるが、これら老朽化の進展に伴う損傷が既に発生しており、道路利用者の安全・安心を確保するために、早期の修繕等が必要な橋梁も確認されている。また、今後急増する修繕等の需要に対し、維持管理の合理化によるコスト縮減が課題となっている。

(2)　目的

上記の背景のもと、今後急速に増大する高齢化した橋梁の維持管理に対応するため、これまでに引き続き、従来型の事後的な修繕・架替えから予防的な修繕および計画的な架替えへと円滑な政策転換を図っていく必要がある。

このため、橋梁の長寿命化及び橋梁の修繕・架替えにかかるコストの縮減を図りつつ、地域の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的として、中長期を見据えた管理方針の見直しを図る長寿命化修繕計画を策定するものである。

(3)　方針

長寿命化修繕計画は、既存の「橋梁長寿命化修繕計画」を基に、最新の橋梁定期点検結果を基礎データとして用いて立案する。

(4)　計画期間

長寿命化修繕計画の計画期間は、10 年とする。また、点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新する。

２　長寿命化修繕計画の対象橋梁（対象橋梁の概況）

(1)　計画対象の橋梁数

みよし市が管理する橋梁は 92 橋あり、全ての橋梁が計画対象である。

表-2.1　計画対象の橋梁数

全管理橋梁数		92 橋
	うち計画の対象橋梁数	92 橋
		うち H25 計画策定橋梁数	63 橋
		うち H28 計画策定橋梁数	87 橋
		うち H31 計画策定橋梁数	90 橋

(2)　橋梁の構成

橋梁種別及び大気種別による対象橋梁 92 橋の構成は、以下のとおりである。対象橋梁のうち、橋梁種別では、コンクリート橋の割合が 91.1%（82 橋）で大半を占め、そのうち PC 橋が 52.2%（47 橋）で最も多い。また、対象橋梁の大気環境は、すべて平野地帯である。

表-2.2　橋梁種別の橋梁数・総橋長

橋梁種別	橋梁数	総橋長
鋼橋※	8 橋	279.7m
RC 橋	14 橋	374.5m
溝橋	21 橋	95.4m
PC 橋	49 橋	1,034.0m
計	92 橋	1,783.6m

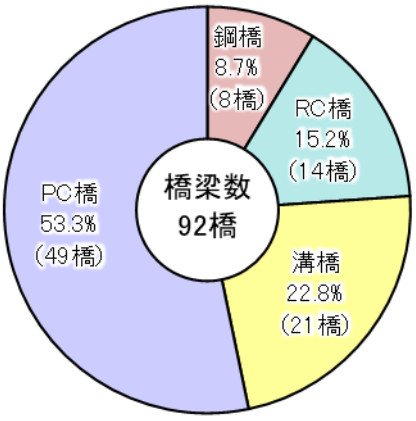


図-2.1　橋梁種別の橋梁割合

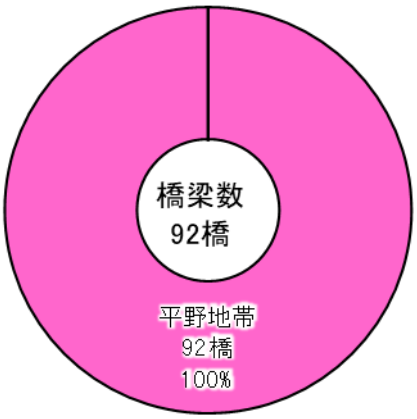


図-2.2　大気環境別の橋梁割合

(3)　橋梁の年齢

供用開始年度別による対象橋梁の橋梁数は、下図のとおりである。対象橋梁の内、昭和47年から平成14年の30年間に集中しており、約87%（80橋）が架設されている。そのため、現時点では、架設後50年以上経過した橋梁は6橋（6.5%）であるが、30年後には75橋（87%）と急増する。

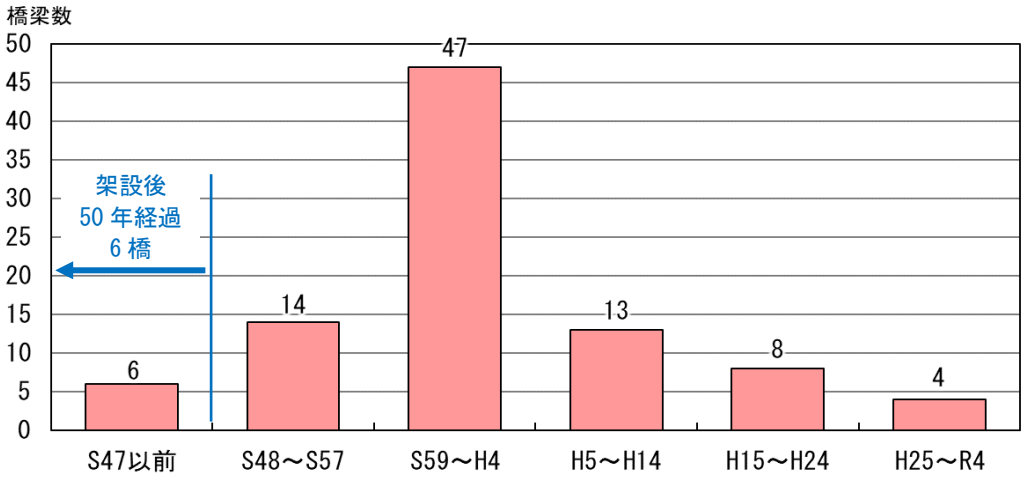


図-2.3　架設年度別の橋梁数

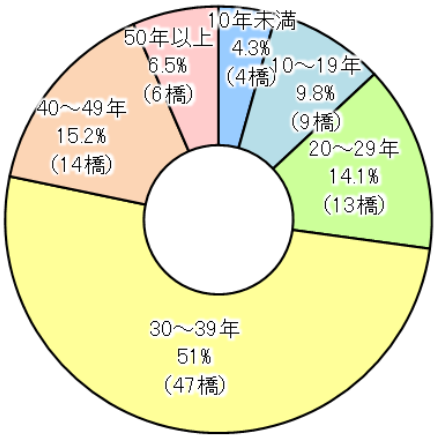


図-2.4　現在の年齢別橋梁割合

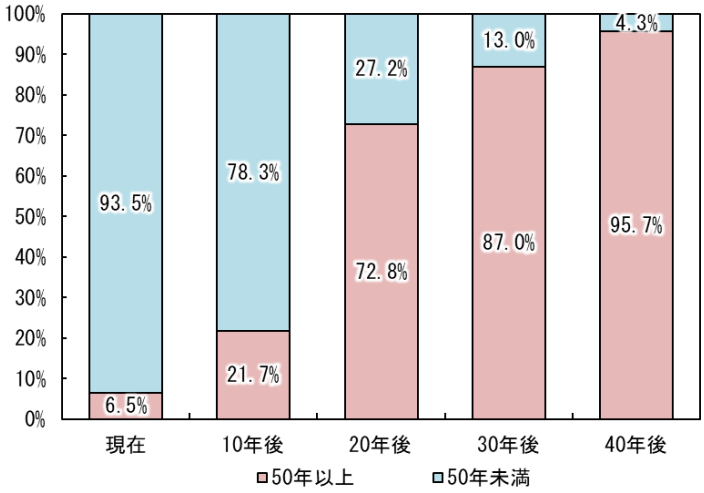


図-2.5　架設後50年以上経過した橋梁割合の推移

3　健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

(1)　健全度の把握に関する基本的方針

対象橋梁の健全度を把握するために、愛知県の「橋梁定期点検要領（案）」に基づいて、5年に1回の頻度で定期点検を実施する。定期点検においては、橋梁の架設年度や構造形式、立地条件等を十分に考慮して点検計画を立て実施する。また、定期点検では、橋梁定期点検要領（案）に基づき、部材単位における損傷の程度等から橋梁の対策の必要性を判定する。

損傷が発見された橋梁については市職員が現地を確認し、道路利用者の安全・安心の確保に万全を期す。また、日頃から維持管理の技術向上に努める。

表-3.1　定期点検における橋梁の対策の必要性

区分	内　容
A	補修を行う必要がない。
B	状況に応じて補修を行う。
C	次回の定期点検までに補修を行う必要がある。
E	まず緊急対応が必要で、その後必要に応じて詳細調査を行い、損傷原因等を明らかにした上で補修を検討する。
S	詳細調査により損傷原因等を明らかにした上で補修を検討する。
※1	点検時に清掃する。
※2	維持作業で対応する。



写真-3.1　専門業者による点検状況①



写真-3.2　専門業者による点検状況②

(2)　日常的な維持管理に関する基本的方針

橋梁の保全を図るため、日常的な点検として道路パトロールを実施する。

道路パトロールでは、パトロール車で走行しながら目視点検を行い、異常が疑われる箇所については徒歩による目視点検を行う。

道路パトロールの実施フローを以下に示す。

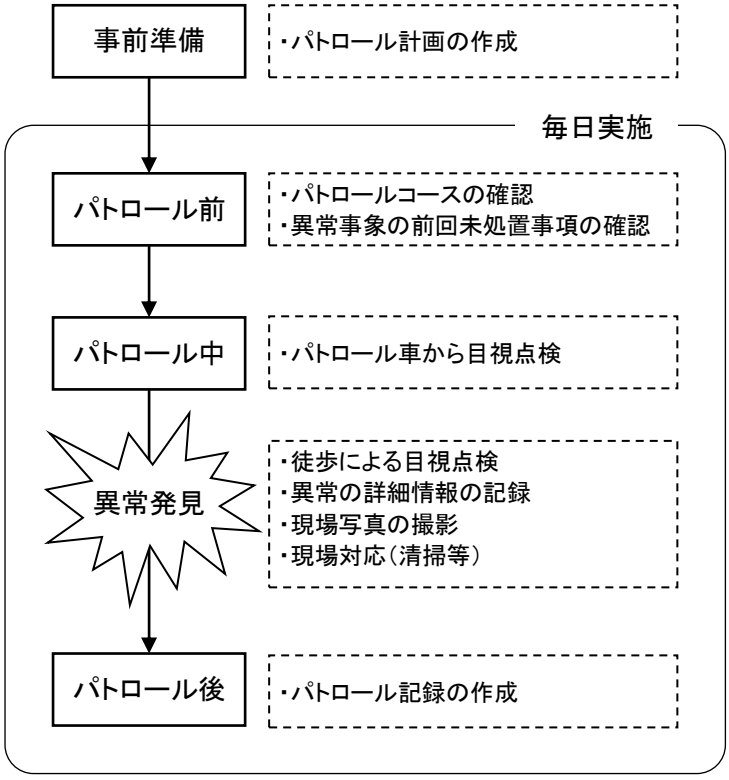


図-3.1　道路パトロール実施フロー

異常を発見した際、道路上の落下物等、現場において対応が可能であるものについてはその場で対応する。具体例として、排水の目詰まりや土砂堆積等を発見した際には必要に応じて堆積土砂の除去等を実施する。

道路パトロールにおける橋梁に関する目視点検項目を下表に示す。

表-3.2　橋梁に関する点検項目

点検項目	確認内容
破損	対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数
腐食	
剥離	
鉄筋露出	
ボルト外れ・ゆるみ	個数
落書き	対象のサイズ（縦(m)×横(m)）、個数
接合部の段差	
土砂堆積	
排水不良	個数
その他	



写真-3.3　職員による点検状況①



写真-3.4　職員による点検状況②

4　対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

(1)　基本的な方針

橋梁の維持管理における基本的な方針は、定期点検の実施により、損傷の度合いおよび対策の必要性を定め、従来の事後的な修繕から予防的な修繕の実施へ転換することで、コストが掛かる架替えを極力なくし、橋梁の長寿命化を図るものとする。

上記の基本的な方針のもと長寿命化を適切に計画することで、修繕・架替えに係る事業の大規模化および高コスト化を回避し、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）が縮減できる。また、損傷が軽微な段階で、早期に修繕を行うことができるため、大規模な事故を未然に防止し、道路利用者の安全・安心を確保することができる。

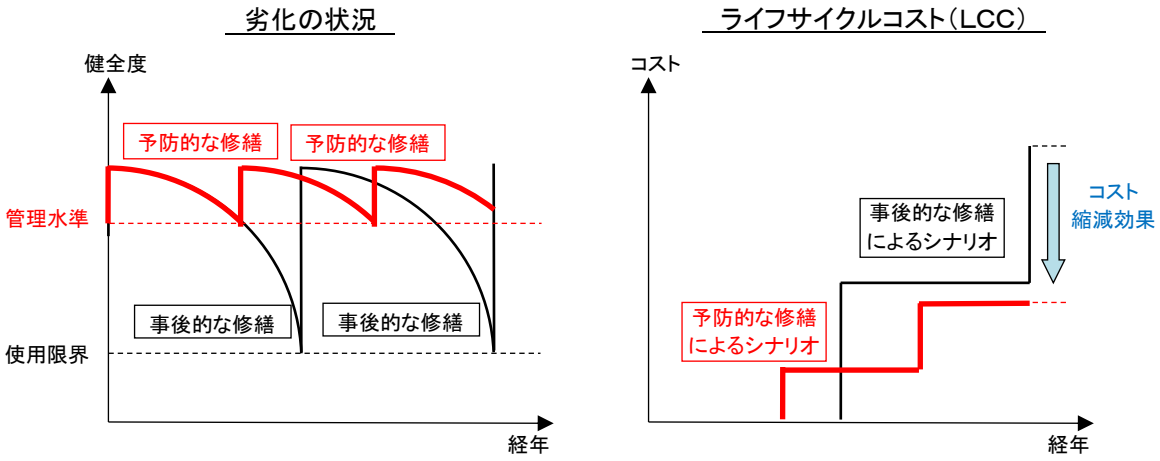


図-4.1　ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）と劣化予測の関連イメージ

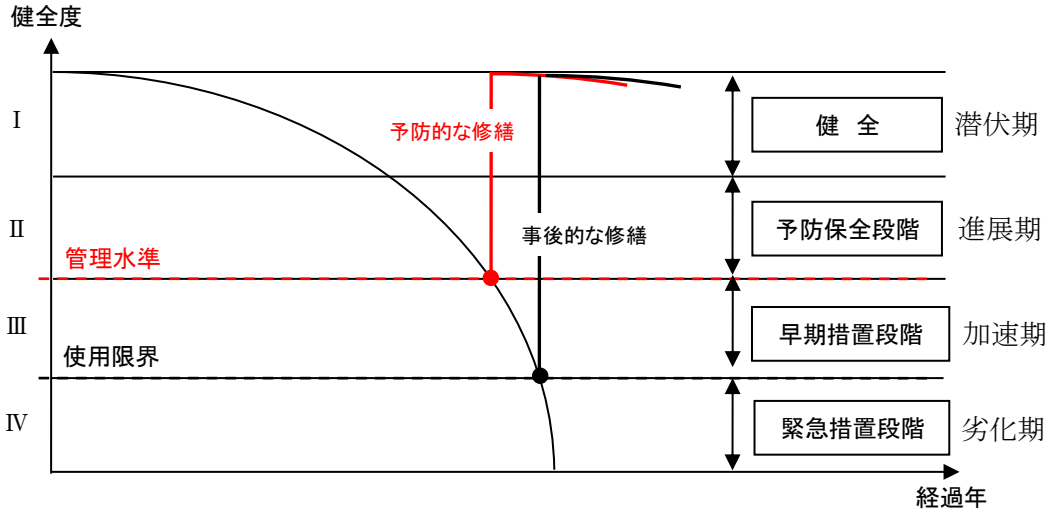


図-4.2　管理水準について

(2)　優先順位の設定

対象橋梁の維持補修を、限られた予算の中で効果的に実施していくためには、対象橋梁に優先順位を設定した上で、工事計画を立案していく必要がある。

優先順位の設定に当たっては、今後、健全度Ⅲに至る前に予防的な修繕を実施し構造安全性の比較が少なくなっていくものと考え、健全度Ⅱの状態における第三者被害の影響を第一優先として、評価を行うものとする。

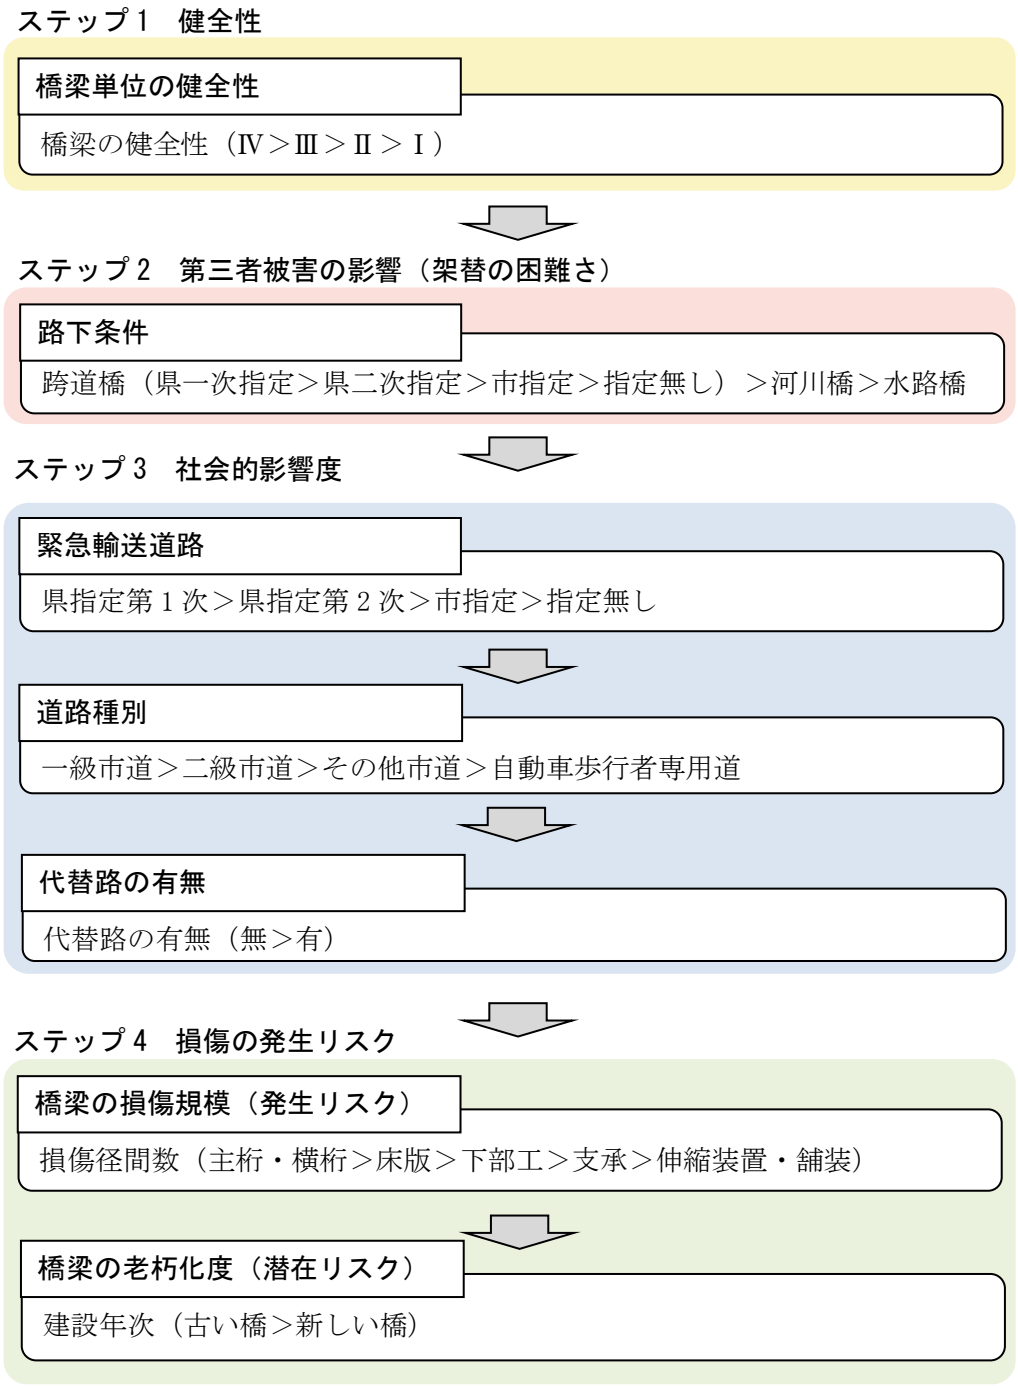


図-4.3　優先順位の選定フロー

(3) 新技術等の活用に関する具体的な方針

近年、グローバル化や AI・ICT 技術等の技術革新が進んでいる中で、橋梁点検・修繕の分野における新技術の活用が期待されている。本計画においても、今後の老朽化対策については、事業の効率化及び費用の縮減を図るため、国土交通省「新技術情報提供システム（NETIS)」の活用及び「新技術利用のガイドライン（案)」を参考にするなど、新工法や新材料などの新技術等の活用を重点的に検討する。

【具体的な方針】

（定期点検）

2 巡目（令和元年度から令和 5 年度）定期点検期間中に、新技術情報提供システム（NETIS）等を活用した資料収集や、コンサルタントからのヒアリング等により、新技術の導入可能性について検討を行った。その結果、現時点で把握している技術については、点検単価や機器調達費、準備作業等を総合的に勘案すると、従来方式と比較して明確なコスト縮減効果は見込めないと判断し、2 巡目点検においては本格的な導入には至らなかった。一方で、3 巡目定期点検（令和 6 年度から令和 10 年度）においては、高所作業車等を要する橋梁や、交通規制の影響が大きい橋梁を中心に、ドローンを活用した近接目視の補完や、画像解析ソフトを用いた損傷把握等の新技術について、試行的な導入を進めることとする。3 巡目定期点検期間において、みよし市が管理する 92 橋のうち、従来方式では足場・高所作業車等を要する橋梁等を対象として、新技術の試行・導入を行う。点検コストの縮減目標については、当初約 100 万円の縮減を見込んでいたが、昨今の資機材価格や労務単価等の物価高騰により点検業務全体の基本単価が上昇している状況を踏まえ、約 30 万円の縮減を図る目標へと見直した。また、新技術導入の試行結果については、点検コスト、作業時間、点検精度等の観点から評価・検証を行い、その結果を踏まえて 4 巡目以降の定期点検の実施方針に反映する。

（補修工事）

すべての橋梁で設計段階から新技術の活用を含めた比較検討を実施する。

(4) 橋梁の集約化・撤去について

管理する橋梁のうち、重要度が相対的に低く、迂回路の確保が可能となり得る橋梁については、将来的な維持管理コストの縮減や、道路ネットワークの効率化の観点から、集約化・撤去の可能性を検討し、候補橋梁の選定にあたったが、迂回路となる道路の整備状況、地域交通への影響、地元の意向等を総合的に勘案した結果、現時点においては生活路線としての重要性が高く、地域住民の合意形成が困難であることから、集約化・撤去の実施を見送ることとした。当初目標としていたコスト縮減についても見送ることとなるが、引き続き既存橋梁の予防保全による長寿命化を図ることで、全体の維持管理コストの縮減に努めるとともに、集約化・撤去の検討をしていく。

５　対象橋梁ごとの点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

(1)　定期点検結果の整理

対象橋梁について、平成 29 年度から令和 3 年度の 5 年間で実施された定期点検結果を以下に示す。

1）対象橋梁の内訳

対象橋梁の定期点検について、平成 29 年度から令和 3 年度の 5 年間における点検年次別の橋梁数を以下に示す。

表 5-1　点検年次別の橋梁数

点検年次	全橋梁	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	令和 2 年度	令和 3 年度
橋梁数	92	23	2	2	55	8

※対象橋梁の内、2 橋は新設のため点検未実施

2）対象橋梁の健全度評価結果

対象橋梁について、定期点検(令和 3 年度末時点)における健全度評価別の割合を以下に示す。なお、対象橋梁のうち、本橋や車道部と歩道部や階段部が区分して判定されている場合は、本橋や車道部の健全度を代表して用いる。また、新設等の点検未実施の橋梁については「健全度Ⅰ」とみなす。

対象橋梁の健全度評価別の割合は、健全度Ⅲが約 5.4%（5 橋）、健全度Ⅱが約 33.0%（22 橋）、健全度Ⅰが約 70.7%（65 橋）という結果となった。

※

表 5-2　健全度の定義

区　分		定　義
Ⅰ	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

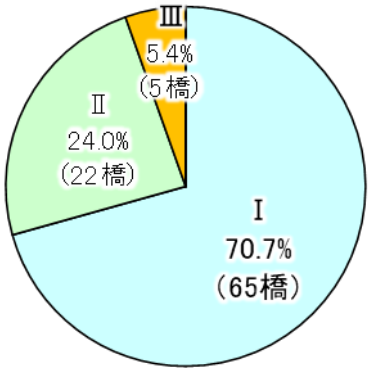


図-5.1　健全度評価結果（橋梁毎）

3） 部材別の損傷状況

対象橋梁の主要部材において、定期点検で確認された損傷を以下に示す。

■ 上部工（鋼材）

上部工（鋼材）の損傷の割合では、腐食、防食機能の劣化が約 67%を占め最も多い結果となった。

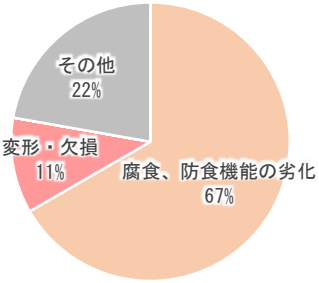


図-5.3　上部工（鋼材）の損傷割合



写真-5.3　損傷状況（鋼材）

■ 上部工（コンクリート部材）

上部工（コンクリート部材）の損傷の割合では、剥離・鉄筋露出、うき、ひびわれ、漏水・遊離石灰といった、鉄筋の腐食により生じる一連の損傷が約 84%を占め最も多い結果となった。

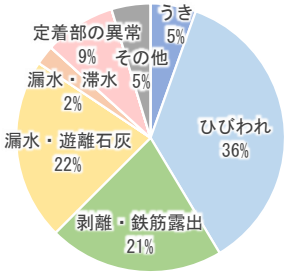


図-5.4　上部工（コンクリート部材）の損傷割合

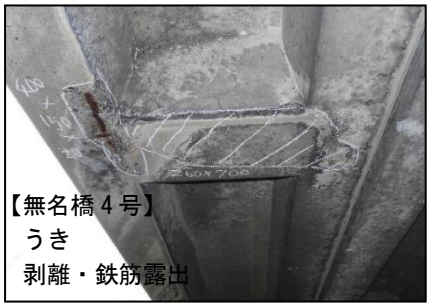


写真-5.4　損傷状況（コンクリート部材）

■ 下部構造（コンクリート部材）

下部構造（コンクリート部材）の損傷では、剥離・鉄筋露出、うき、ひびわれ、漏水・遊離石灰といった、鉄筋の腐食により生じる一連の損傷が約 84%を占め最も多い結果となった。

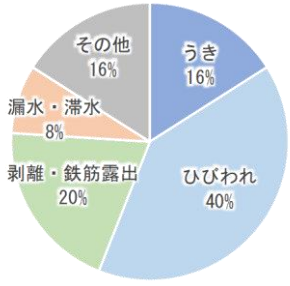


図-5.5　下部構造（コンクリート）の損傷割合

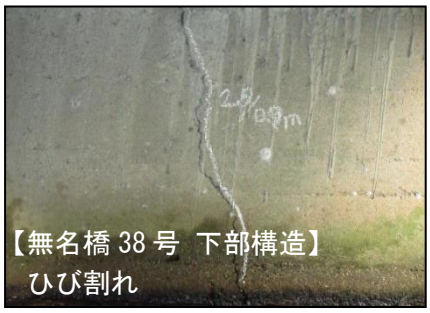


写真-5.5　損傷状況（下部構造）

(2) 修繕内容・時期又は架替え時期の設定

長寿命化修繕計画の基本的な考え方は、定期点検で健全度Ⅲと区分されたものから修繕を実施し、その他の橋梁は、劣化予測結果および各橋梁の優先順位を用いて、健全度Ⅲに至る前に予防保全的な対策を実施するものとする。

1) 劣化予測

劣化予測は、部材や材料、構造形式などの指標ごとにグルーピングを行った上で、グループごとで統計的な手法を用いて行った。

2) ライフサイクルコストの算出

将来的に発生する維持管理コスト、運営コスト、廃棄コスト、更新コスト等を踏まえた経済性を評価した上で、中長期的な視点からの戦略的管理計画を立案することを目的にライフサイクルコストの算出を行った。

ライフサイクルコストの算出は、以下の 2 パターンで行い、それぞれの場合の比較を行った。

a) 事後保全管理型：橋梁に著しい損傷が発生してから補修

b) 予防保全管理型：定期的に点検を実施し損傷が軽微なうちに補修

3) 修繕措置の着手状況

「2) 対象橋梁の健全度評価結果」に基づく修繕措置の着手状況を以下に示す。

表 5-3　修繕措置の着手状況

着手予定年度及び完了年度	橋梁名	修繕前の点検結果	着手予定年度及び完了年度	橋梁名	修繕前の点検結果
2015	茹生橋	Ⅱ	2025	旭橋	Ⅱ
2016	三好ケ丘高架橋	Ⅱ	2027	八和田山橋	Ⅱ
2017	東明跨道橋	Ⅱ	2027	無名橋 38 号	Ⅲ
2018	御嶽橋	Ⅱ	2028	新池橋	Ⅱ
2019	無名橋 53 号	Ⅱ	2028	砲録橋	Ⅱ
2020	無名橋 40 号	Ⅲ	2028	地念古橋	※
2020	無名橋 39 号	Ⅲ	2029	桜橋	Ⅱ
2021	地念古橋	Ⅱ	2029	無名橋 54 号	Ⅱ
2022	無名橋 54 号	Ⅲ	2030	三好丘駅前橋	Ⅱ
2023	砲録橋	Ⅱ	2030	無名橋 13 号	Ⅱ
2023	桜公園橋	Ⅱ	2031	郡界橋	Ⅱ
2024	インター根浦橋	Ⅲ	2031	無名橋 27 号	Ⅱ
2024	坂上橋	Ⅲ		以下余白	

※令和８年度夏に剥離あり。高架下が高速道路のため優先的に修繕を要する。

6　長寿命化修繕計画による効果

(1)　維持管理方針別のライフサイクルコスト

対象橋梁 92 橋の修繕・架替えに係る事業費について、維持管理方針別に試算した今後 50 年間のライフサイクルコストを以下に示す。

1) 事後保全管理型の場合

事後保全管理型の場合における今後 50 年間のライフサイクルコストは、約 27.2 億円という結果となった。また、単年度あたりの事業費は、約 51 百万円という結果となった。

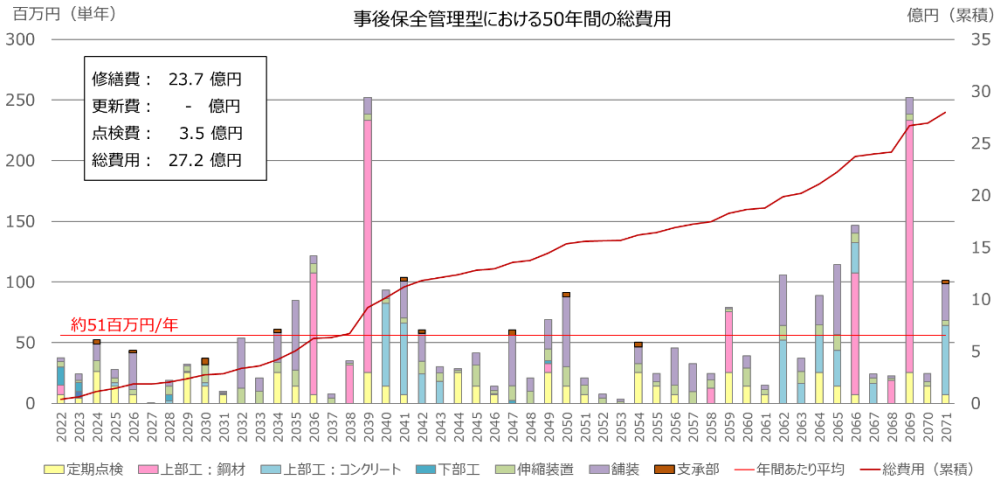


図-6.1　ライフサイクルコストの試算結果（事後保全管理型）

2) 予防保全管理型の場合

予防保全管理型の場合における今後 50 年間のライフサイクルコストは、約 21.1 億円という結果となった。また、単年度あたりの事業費は、約 39 百万円という結果となった。

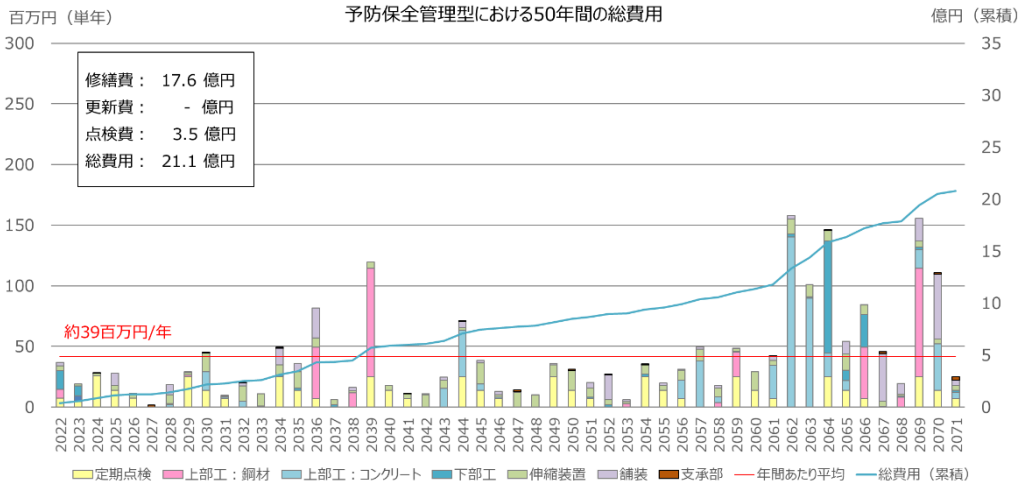


図-6.2　ライフサイクルコストの試算結果（予防保全管理型）

(2)　維持管理方針の転換によるコスト縮減効果

対象橋梁 92 橋の修繕・架替えに係る事業費について、事後保全管理型の維持管理方法の場合と予防保全管理型の維持管理方法の場合を比較すると、今後 50 年間における試算結果は、事後保全管理型の場合が約 27.2 億円、予防保全管理型の場合が約 21.1 億円となり、約 80%のコスト縮減が期待できる結果となった。また、健全度Ⅲの橋梁が少ないため、これまでと同様に予算が計上されれば、先送りすることなく、維持管理に係る事業費を賄える見込みである。

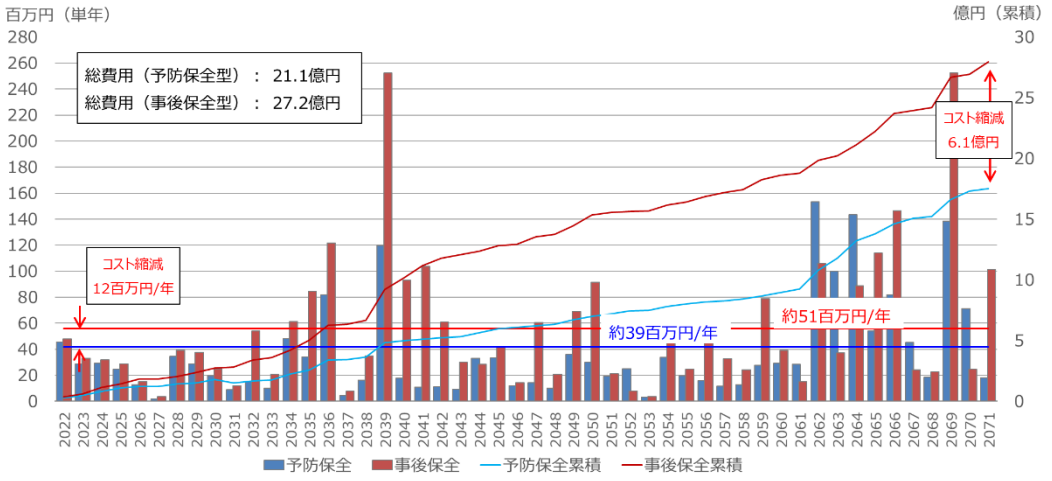


図-6.3　50 年間におけるコスト縮減効果

7　計画策定担当部署

みよし市 都市建設部 道路河川課　TEL：0561-32-8020

8. 対象橋梁一覧（年次計画）

No.	橋梁名	路線名	所在地	架設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	点検結果(1巡目)		点検結果(2巡目)		点検結果(3巡目)		点検計画										修繕計画(※1)										対策概算費用(百万円)	主な対策内容
														2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)	2022(R4)	2023(R5)	2024(R6)	2025(R7)	2026(R8)	2027(R9)	2028(R10)	2029(R11)	2030(R12)	2031(R13)		
1	清水橋	市道黒笹諸輪線	黒笹町清水	1982	12.0	9.2	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
2	無名橋4号	市道打越黒笹1号線	萓生町小坂	1985	10.0	8.9	PC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	Ⅱ				○					○													
3	無名橋7号	市道根浦町福谷線	福谷町西道上	1995	14.0	10.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
4	無名橋10号	市道潮見ヶ丘打越線	打越町上池田	1965	5.0	3.5	RC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
5	無名橋13号	市道新屋大原線	三好町井ノ花	1975	5.0	6.6	PC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	Ⅱ				○					○										○			断面補修工
6	八幡川橋	市道流谷深田線	明知町堤浦	2021(1963)	7.0	5.6	PC橋	2015	Ⅰ	架替え・新設		2025	Ⅰ				○					○													
7	無名橋22号	市道三好丘伊保線	福谷町広久伝	1978	12.0	4.0	鋼橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	Ⅱ				○					○													
8	無名橋23号	市道蟹畑線	福谷町定一貫	1972	7.0	4.9	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
9	無名橋24号	市道落合阿弥陀堂線	三好丘桜二丁目	1975	7.0	6.0	RC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
10	無名橋27号	市道打越黒笹2号線	萓生町下石田	1966	3.0	8.7	RC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	Ⅱ				○					○											○		断面補修工
11	大日橋	市道福谷通学線	福谷町落合	2010	12.0	9.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
12	庚申橋	市道打越本地線	打越町庚申	1973	6.0	8.9	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
13	無名橋38号	市道打越大塚線	打越町南小林	1988	3.0	12.9	RC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	Ⅲ				○					○							○					2.1	断面補修工、ひび割れ補修工
14	八幡橋	市道明知八幡線	明知町深田	1989	10.0	12.5	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
15	下田橋	市道下田下畑線	明知町下田	1974	11.0	5.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
16	明知橋	市道今池下流谷線	明知町丸山	1987	11.0	7.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
17	無名橋40号	市道塩田青木線	明知町仲田	1987	8.0	10.0	鋼橋	2015	Ⅲ	2020	Ⅲ	2025	Ⅰ				○					○		◎											※2020年度対応済み
18	八和田山橋	市道八和田西山線	三好町八和田山	1987	14.0	14.7	PC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	Ⅱ				○					○							○					5.4	断面補修工、ひび割れ補修工
19	大力池橋	市道黒笹三本木線	黒笹町大力池下	1991	11.0	10.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
20	新寺田川2号橋	市道三好丘桜10号線	三好丘桜二丁目	1995	7.0	9.1	RC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
21	新寺田川1号橋	市道三好丘桜12号線	三好丘桜二丁目	1992	7.0	6.0	RC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
22	郷浦橋	市道萓生舟ヶ峪線	萓生町郷浦	1999	6.0	9.3	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
23	青木橋	市道青木線	新前田	2018	20.0	20.0	PC橋	新設		2022		2027		○					○																
24	大原橋	市道平池前田線	新前田	2017	18.6	20.0	PC橋	新設		2021	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
25	笠松橋	市道井ノ花笠松線	三好町笠松	2001	14.0	8.7	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
26	無名橋61号	市道柿ノ木井ヶ谷線	明知町割目池	2003	13.0	6.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
27	新切川橋	市道根浦諸輪線	福谷町根浦	2008	10.0	6.3	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
28	南井山橋	市道三好丘線	三好丘五丁目	1987	13.0	3.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
29	黒笹1号橋	市道黒笹2号線	黒笹いずみ一丁目	1991	9.0	6.3	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
30	黒笹2号橋	市道黒笹いずみ10号線	黒笹一丁目	1990	9.0	8.1	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
31	黒笹3号橋	市道黒笹いずみ10号線	黒笹いずみ一丁目	1991	9.0	8.1	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
32	昭和橋	市道竹ヶ花三好丘線	福谷町道之後	1986	20.0	12.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
33	萓生橋	市道萓生舟ヶ峪線	萓生町山ノ上	1966	54.0	6.0	PC橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅰ	2026						○					○	◎											※2015年度対応済み
34	三好ケ丘高架橋	市道福谷線	福谷町井守下	1984	128.0	12.0	PC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○		◎											※2016年度対応済み
35	寺田橋	市道寺ノ前三好丘線	福谷町寺田	1983	21.0	9.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
36	川原橋	市道打越黒笹1号線	萓生町川原	1984	31.0	9.1	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
37	地念古橋	市道福谷根浦線	福谷町上地念古	1991	57.0	9.3	鋼橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅱ	2026						○					○	◎						○					塗装塗替工
38	愛宕橋	市道萓生新田線	萓生町汁原	1985	30.0	4.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
39	御嶽橋	市道山ノ間小林線	打越町後田	1985	19.0	9.0	PC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○		◎											※2018年度対応済み
40	砲録橋	市道大慈山宝栄線	明知町宝栄	1979	20.0	3.5	PC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	Ⅱ				○					○			◎					○				24.9	断面補修工、塗装塗替工、防護柵設置
41	伊保橋	市道井守下線	福谷町井守下	1986	21.0	6.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
42	仲田橋	市道花立阿弥陀堂線	福谷町仲田	1986	20.0	4.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
43	棚田橋	市道落合阿弥陀堂線	福谷町寺田	1986	21.0	4.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
44	東明跨道橋	市道萓生打越線	三好町東山	1987	36.0	8.8	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○		◎											※2017年度対応済み
45	北井山橋	市道三好丘自転車歩行者専用道路2号線	三好丘一丁目	1984	28.0	3.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
46	三好丘駅前橋	市道三好丘駅前線	三好丘一丁目	1982	20.0	11.7	PC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	Ⅱ				○					○										○		18.3	断面補修工
47	三好丘橋	市道三好丘自転車歩行者専用道路5号線	三好丘二丁目	1985	19.0	5.0	RC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
48	三好丘通学橋	市道三好丘自転車歩行者専用道路15号線	三好丘五丁目	1987	20.0	3.0	PC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
49	福谷橋	市道落合辰己山線	福谷町落合	1994	22.0	12.4	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
50	無名橋53号	市道三好丘自転車歩行者専用道路4号線	三好丘二丁目	1987	92.0	9.0	RC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○		◎											※2019年度対応済み
51	木之本橋	市道平池砂後線	三好町木之本	2002	19.0	6.6	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
52	郡界橋	市道打越向野線	打越町向野	1968	29.0	8.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅱ	2025	Ⅱ				○					○											○		断面補修工、ひび割れ補修工
53	上砂後橋	市道平池砂後線	三好町上砂後	2001	18.0	6.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
54	インター根浦橋	市道打越黒笹1号線	根浦町４丁目	1992	37.0	9.3	PC橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅲ	2026						○					○			◎									※2024年度対応済み
55	インター根浦橋歩道橋	市道打越黒笹1号線	根浦町４丁目	2009	46.0	2.0	鋼橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						○					○												
56	中島橋	市道中島線	三好町中島	2009	20.0	20.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
57	高嶺橋	市道三好ヶ丘駒場線	打越町新池浦	2009	54.0	16.0	鋼橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅱ	2026						○					○												
58	無名橋54号	市道三好丘自転車歩行者専用道路4号線	三好丘三丁目	1986	139.0	4.0	RC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅲ	2025	Ⅱ				○					○		◎								○		38.5	断面補修工、歩道再舗装
59	旭橋	市道三好丘自転車歩行者専用道路5号線	三好丘旭五丁目	1990	43.0	2.2	RC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	Ⅰ				○					○					◎								※2025年度対応済み
60	井守橋	市道三好丘線	三好丘五丁目	1986	43.0	3.0	PC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○					○													
61	桜橋	市道三好丘線	三好丘桜一丁目	1987	25.0	4.0	RC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	Ⅱ				○					○										○		3.5	断面補修工、ひび割れ補修工
62	桜公園橋	市道三好丘線	三好丘六丁目	1988	18.0	3.4	RC橋	2015	Ⅱ	2020	Ⅱ	2025	Ⅰ				○					○			◎									※2023年度対応済み
63	無名橋26号	市道打越黒笹2号線	萓生町曙	1966	4.9	10.8	PC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
64	無名橋5号	市道打越黒笹1号線	萓生町山ノ神前	1988	3.7	10.4	PC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
65	無名橋6号	市道打越黒笹1号線	萓生町百鳴	1987	3.1	11.6	RC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
66	無名橋28号	市道新田根浦線	萓生町小根	1972	4.1	9.4	RC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
67	無名橋30号	市道萓生坂上線	萓生町百鳴	1975	4.3	3.5	RC橋	2017	Ⅱ	2022		2027			○				○																
68	無名橋56号	市道新田池上線	萓生町池上	1992	2.0	11.8	PC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
69	無名橋29号	市道辰己山小金下線	萓生町前田	1975	11.0	4.3	RC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
70	無名橋9号	市道萓生新田線	萓生町仲田	1975	5.0	2.8	RC橋	2017	Ⅱ	2022		2027			○				○																
71	無名橋1号	市道明知新屋線	明知町池田	1988	2.2	23.0	RC橋	2017	Ⅱ	2022		2027			○				○																
72	無名橋17号	市道三好福田線	三好町平子	1975	2.2	9.5	PC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
73	無名橋18号	市道大上福田線	西一色町荒井	1983	3.1	6.4	RC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
74	無名橋51号	市道折坂猿投松線	三好町石畑	1989	2.8	6.3	PC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
75	無名橋2号	市道三好明知下線	明知町塔ノ下	2014	9.2	10.5	RC橋	2017	Ⅱ	2022		2027			○				○																
76	宮前橋	市道上ヶ池東谷線	明知町塔ノ下	1987	5.0	10.2	RC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
77	無名橋52号	市道島中砲録山線	明知町島中	1989	2.3	6.9	PC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
78	無名橋36号	市道大日千足線	打越町苗座	1986	2.6	4.4	PC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
79	無名橋37号	市道南二池下線	打越町南二池下	1978	5.1	19.3	RC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
80	無名橋39号	市道明知福田線	福田町宮下	1986	4.3	11.5	RC橋	2017	Ⅲ	2022		2027			○				○					◎											※2020年度対応済み
81	無名橋43号	市道原傍示本線	三好町薬師前	1982	3.1	3.2	RC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
82	無名橋21号	市道一色前線	三好町一色前	1976	2.9	4.1	RC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
83	無名橋55号	市道落合辰己山線	萓生町曙	1991	4.6	14.5	RC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
84	無名橋60号	市道南屋敷苗座線	打越町苗座	2004	3.6	3.5	PC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
85	無名橋65号	市道黒笹自転車歩行者専用道5号線	黒笹一丁目	1991	10.4	5.0	PC橋	2015	Ⅰ	2020	Ⅰ	2025	Ⅰ				○				○														
86	無名橋62号	市道落合辰己山線	福谷町寺田	1993	10.8	11.0	PC橋	2017	Ⅰ	2022		2027			○				○																
87	定一貫橋	市道打越黒笹1号線	福谷町上知念古	2001	42.0	3.0	鋼橋	2016	Ⅰ	2021	Ⅰ	2026						○					○												
88	新池橋	市道インター1号線	根浦町三丁目	1993	95.0	16.0	PC橋	2014	Ⅱ	2019	Ⅱ	2027				○			○													○			34.6	断面補修工、ひび割れ補修工
89	打上橋	市道福谷三好線	萓生町上永井田	1984	35.9	16.0	鋼橋	2018	Ⅱ	2023		2027				○			○																
90	坂上橋	市道インター1号線	福谷町坂上	1992	24.8	3.1	鋼橋	2016	Ⅱ	2021	Ⅲ	2026						○					○				◎								※2024年度対応済み
91	前田橋	市道新前田11号線	新前田	2020	14.1	6.0	PC橋	新設		2023		2027				○			○																
92	砂後川橋	市道福谷三好線	萓生町川岸当	1990	21.0	15.2	PC橋	2018	Ⅱ	2023		2027				○			○																

※1　修繕については「◎」が2025年度までに実施済みのもの。
